

# 私の現場

工事名: 東九州道(大崎～鹿屋)細山田橋上部工工事

施工者: 株式会社 安部日鋼工業

## ①目的・概要


東九州道は、北九州市を起点に大分県、宮崎県を経て、鹿児島市に至る延長436kmの高速自動車道です。  
志布志～末吉財部間は、曾於市・鹿屋市・大崎町・志布志市の3市1町を結ぶ区間であり、九州の高速道路ネットワークを形成するものです。

工事を行う鹿屋串良JCT～大崎IC間は、平成32年度の開通を目標に、交通混雑の緩和、輸送時間の短縮によるコスト縮減、沿線都市の交流人口の増加、大規模災害時の避難道の効果が期待されています。

位置図



## 全体概要

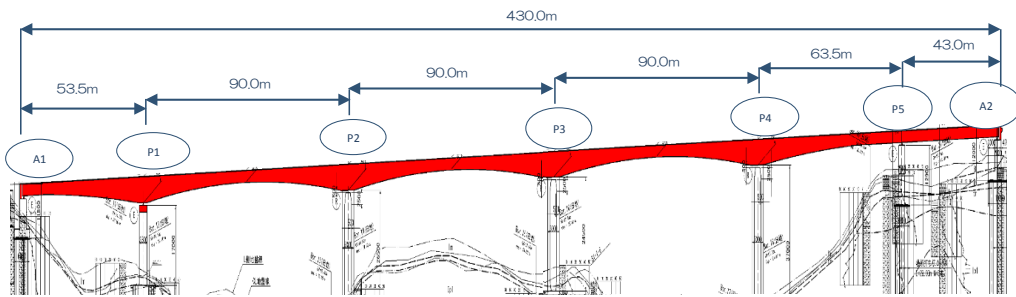

## 現場の特徴

本工事は、鹿屋串良JCT～大崎IC間にある、細山田橋(L=430.0m)の橋梁上部工工事です。  
4橋脚(P1～P4)からは移動作業車を用いた片持架設工法、柱頭部・A1側径間部およびP5～A2径間は固定支保工で施工する、PC6径間連続ラーメン箱桁橋です。  
施工順序は、P3・P4の柱頭部～片持架設を行い、その後P1・P2の片持架設を行います。  
P1・P2の柱頭部は、P3・P4の片持架設中に行います。  
片持架設完了にあわせて、A1側径間部、P5-A2径間部および中央閉合部の施工を行います。  
桁の施工が全て完了した後、壁高欄、排水装置等の施工を行います。

## ②現場の見頃及び受入れ条件

### 現場の見頃

現場の見頃は、張出し施工が進行中の、平成30年11月～平成31年8月頃です。

### 受け入れ条件

一度に受入れ可能最大人数：50人  
対象者の年齢：特に無し。(ヘルメットをかぶれる幼児以上の方)

### 連絡先

一般社団法人プレストレストコンクリート建設業協会 九州支部  
福岡市中央区渡辺通2-4-8(富士ピー・エス内)

TEL 092-751-0456 FAX 092-714-3942

E-mail k.yoshimura@fujips.co.jp
